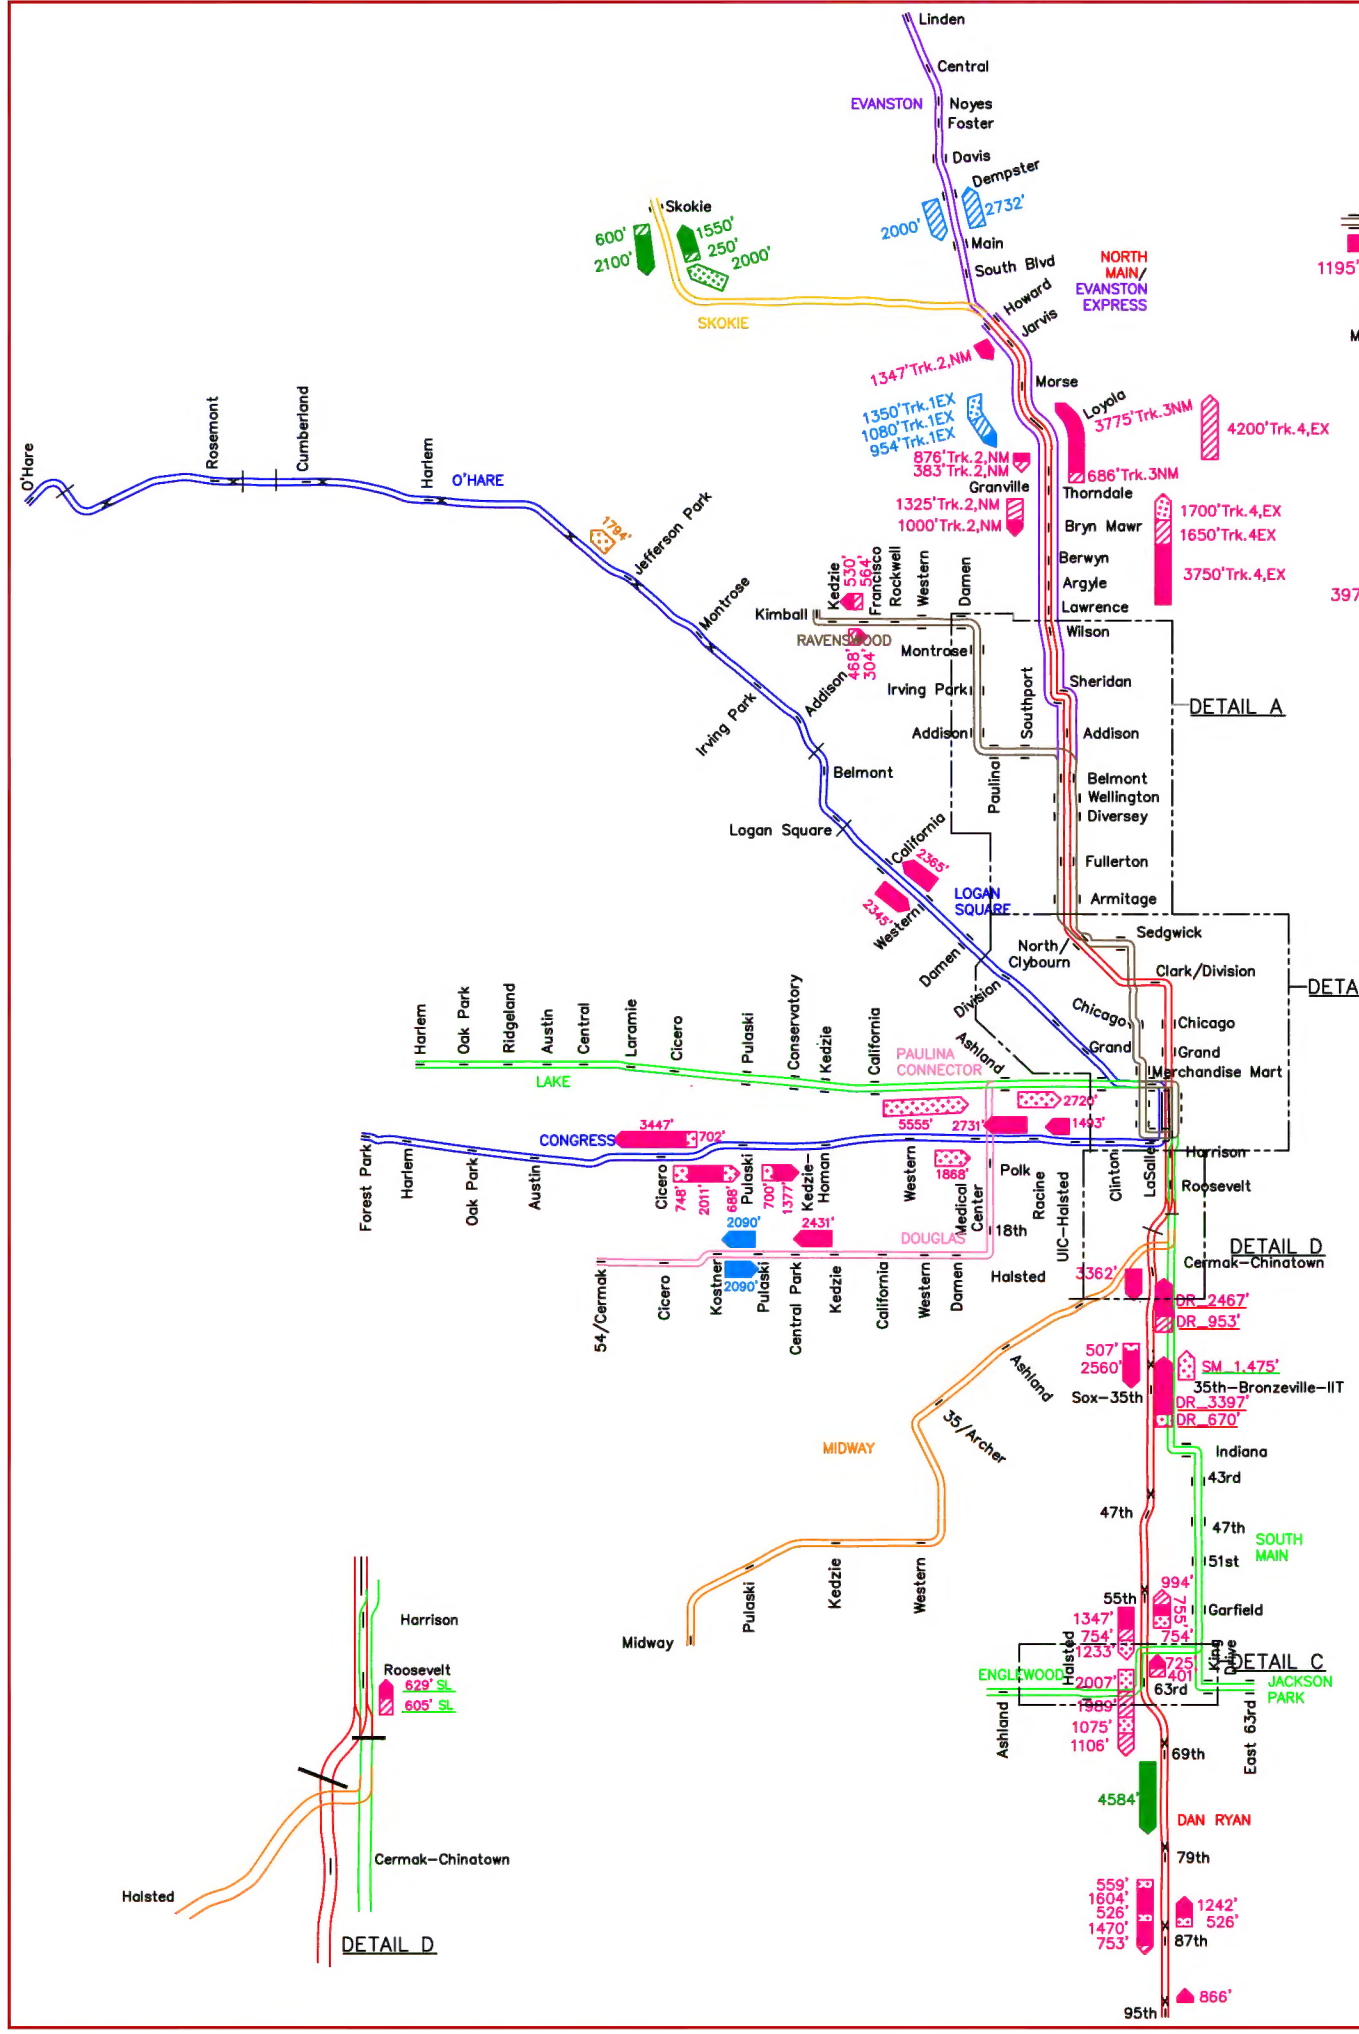

SLOW ZONE BY AREA				
Track (CTA)	15 mph	65,176	116,669	
	25 mph	24,260		
	35 mph	27,233		
Structure (CTA)	15 mph	5,134	12,296	
	25 mph	5,812		
	35 mph	1,350		
Signal (CTA)	15 mph	0	1,794	
	25 mph	0		
	35 mph	1,794		
Power (CTA)	15 mph	0	0	
	25 mph	0		
	35 mph	0		
Construction (CTA/Contractor)	15 mph	10,929	13,779	
	25 mph	850		
	35 mph	2,000		

TOTAL SLOW ZONE TRACK

Rail Line	15 mph	25 mph	35 mph	Total Slow Zone	Linear Trk.-Ft.	% Slow	Movement Removed	Movement Added	Total SZ	% Slow
Congress	11,059	0	4,706	15,765	94,010	16.8	0	0	22,269	7.6
O'Hare/Logan Square	4,710	0	1,794	6,504	152,956	4.3	804	0		
Dearborn Subway	0	0	0	0	45,818	0	0	0		
North Main Line	6,998	2,394	0	9,392	78,966	11.9	0	0	52,329	22.6
State Subway	2,814	937	0	3,751	51,328	7.3	0	0		
Dan Ryan	24,379	5,997	8,810	39,186	101,332	38.7	3,522	1,332		
Skokie	3,650	850	2,000	6,500	52,146	12.5	0	500	6,500	12.5
Evanston	0	4,732	0	4,732	40,714	11.6	1,345	0	19,416	19.1
Evanston Express	4,704	6,930	3,050	14,684	60,970	24.1	1,825	1,825		
Loop	0	0	0	0	21,470	0	0	0	0	0
Ravenswood/Ravenswood-Loop	15,685	7,202	925	23,812	98,364	24.2	0	3,775	23,812	24.2
Midway/Grand Junction	0	0	0	0	99,224	0	0	0	0	0
Lake	0	0	8,275	8,875	93,114	8.9	4,520	3,920	13,601	6.9
South Loop/South Main Line	629	605	1,475	2,709	68,906	3.9	652	0		
Englewood	0	1,275	1,342	2,617	31,916	8.2	0	0		
Jackson Park	0	0	0	0	12,162	0	0	0		
Douglas/Paulina Connector	6,611	0	0	6,611	77,710	8.5	0	0	6,611	8.5
TOTALS	81,239	30,922	32,377	144,538	1,181,106	12.2	12,668	11,352		

NOT TO SCALE
GRAPHICAL REPRESENTATION

		IN CHARGE C.B.	CTA RAIL CUSTOMER IMPACT MAP
		APPROVED BY B.M.jr	
		CHECKED BY B.M.jr	
		UPDATED BY D.E.	
16 MAY 06	ORIGINAL	ORIGINATED BY J.J.H.	
DATE	DESCRIPTION	Prepared by: Track Maintenance	September 09, 2011
